


Factores de éxito y fracaso en proyectos de TI

Grupo 2 (G2)

Integrantes: Larco Esteban · Alexandra Tana

Docente: Javier Cevallos

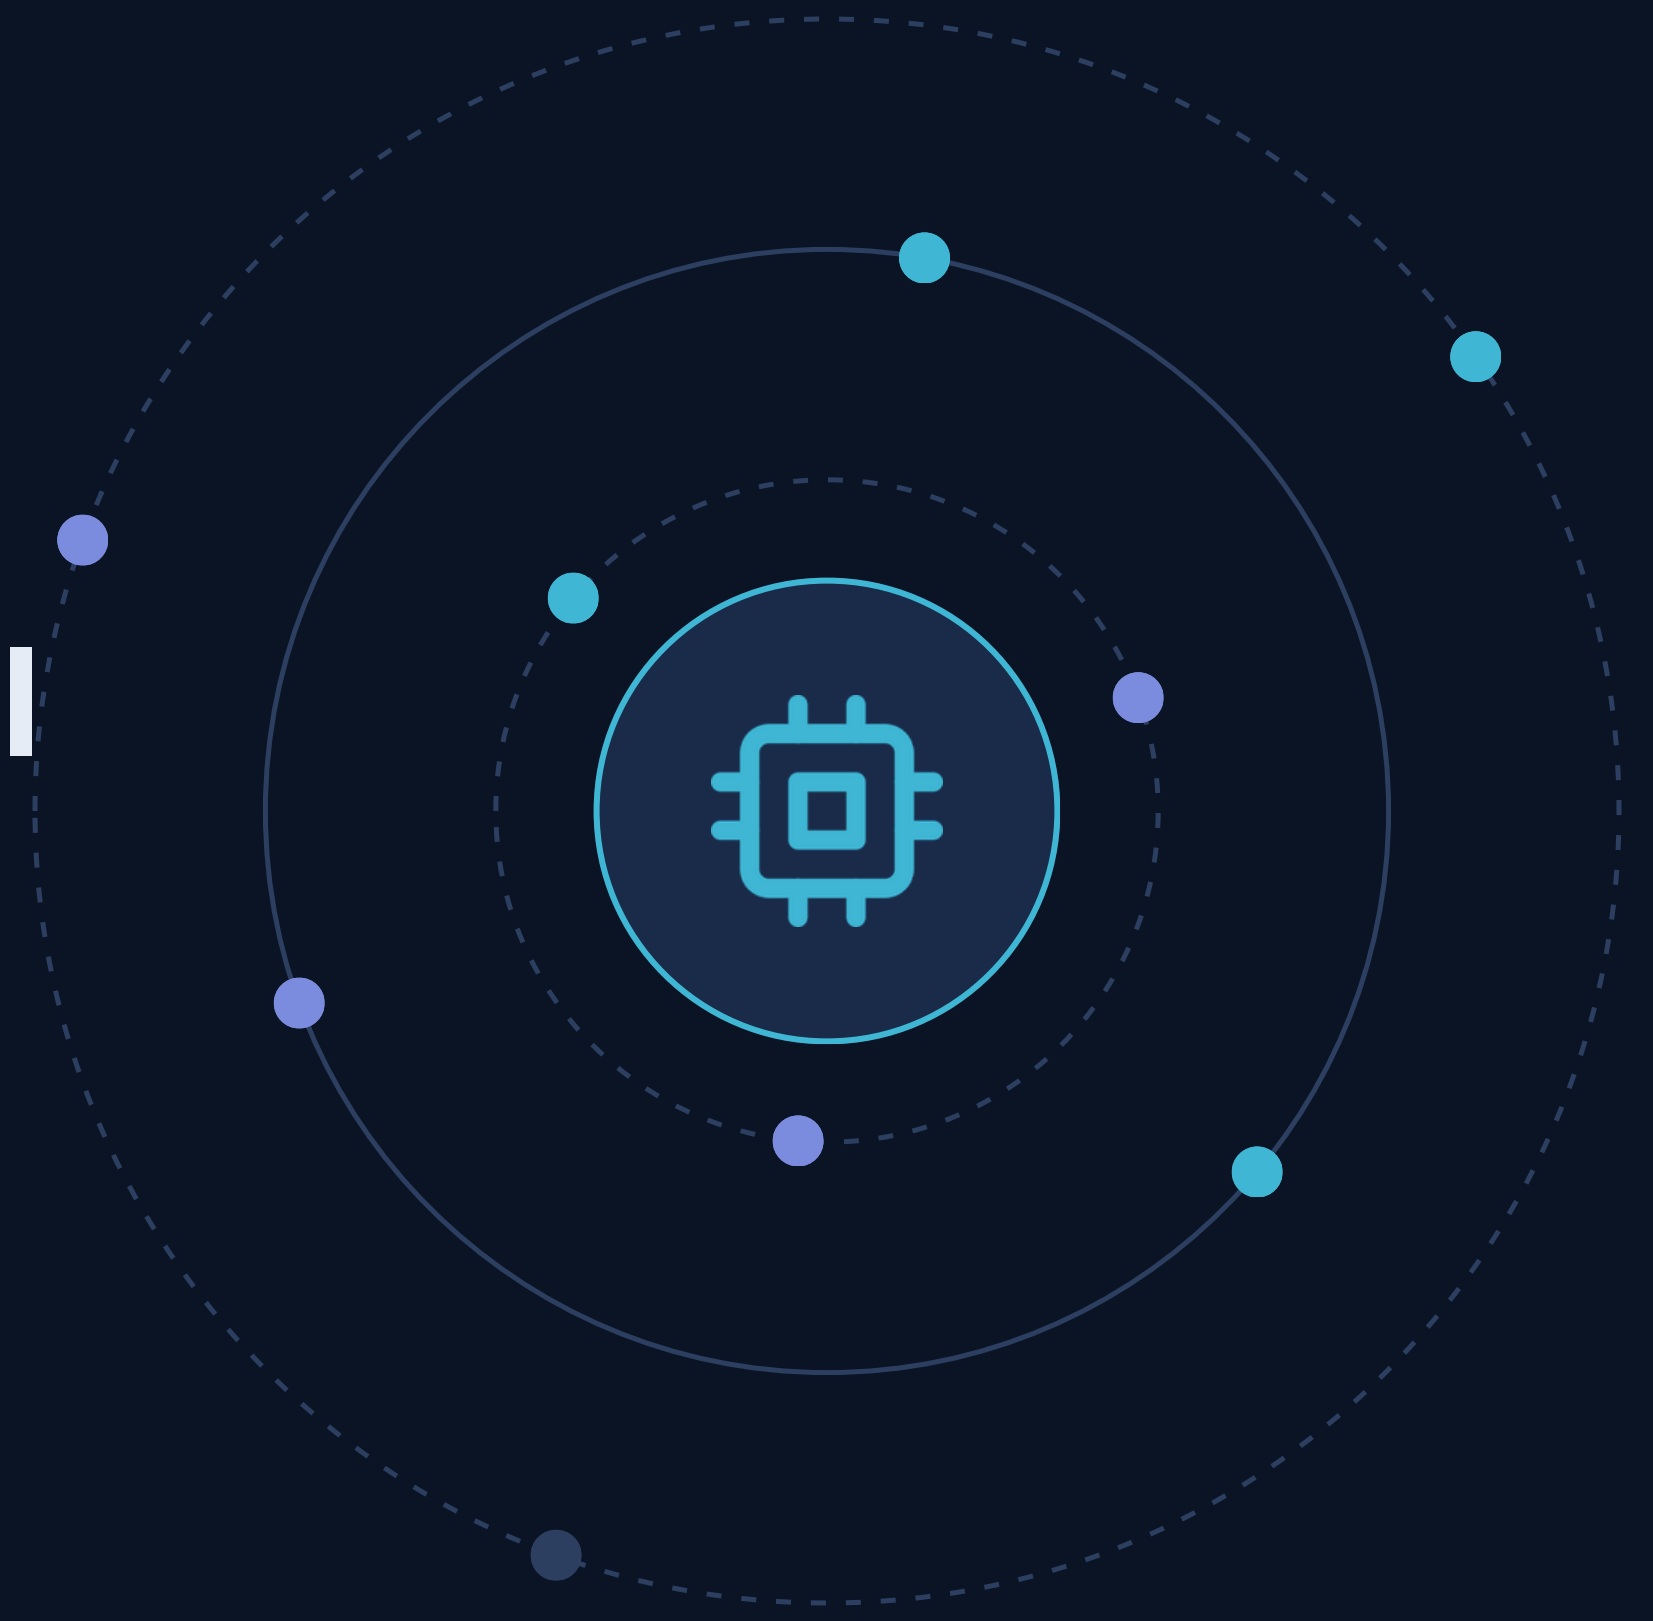



¿Cuándo es exitoso un proyecto?

VISIÓN TRADICIONAL

Cumplir lo planificado



Alcance



Tiempo



Costo



VISIÓN BASADA EN VALOR (PMBOK 8)

Entregar beneficios reales



Beneficios



Interesados



Adopción y uso

Cumplir alcance, tiempo y costo no basta: un proyecto puede entregarse a tiempo y aun así no ser usado ni generar beneficios.



CHAOS 2020: el éxito sigue siendo la excepción

31%

Exitosos

Cumplen los criterios de éxito definidos

50%

Cuestionados

Se entregan con retrasos, sobrecostos o menos funcionalidad

19%

Fallidos

Se cancelan o se entregan y nunca se usan



Proporción de proyectos de software según resultado



Lectura crítica. Eveleens y Verhoef (2010) cuestionan cómo el CHAOS Report define y mide el éxito. Se usa como referencia de tendencia, no como medida exacta.



Factores de éxito y de fracaso



Factores de éxito

- Patrocinio ejecutivo activo
- Participación de los usuarios
- Objetivos de negocio claros
- Equipo competente y roles claros
- Alcance acotado y entregas frecuentes
- Enfoque adaptable y gestión de riesgos



Factores de fracaso

- Requisitos ambiguos o cambiantes
- Poca participación de usuarios y patrocinador
- Estimaciones poco realistas
- Gobernanza y supervisión débiles
- Pruebas insuficientes antes del lanzamiento
- Mala gestión de proveedores y riesgos




Enfocarse en el valor y su relación con el éxito

Principio: enfocarse en el valor

- 1 Define el éxito desde el inicio**
Beneficios medibles acordados, no solo entregables.
- 2 Orienta las decisiones**
Si el valor cambia, se replantea el alcance o se cancela a tiempo.
- 3 Se materializa en los dominios**
Gobernanza, alcance, finanzas, interesados y riesgo.

7 dominios de desempeño

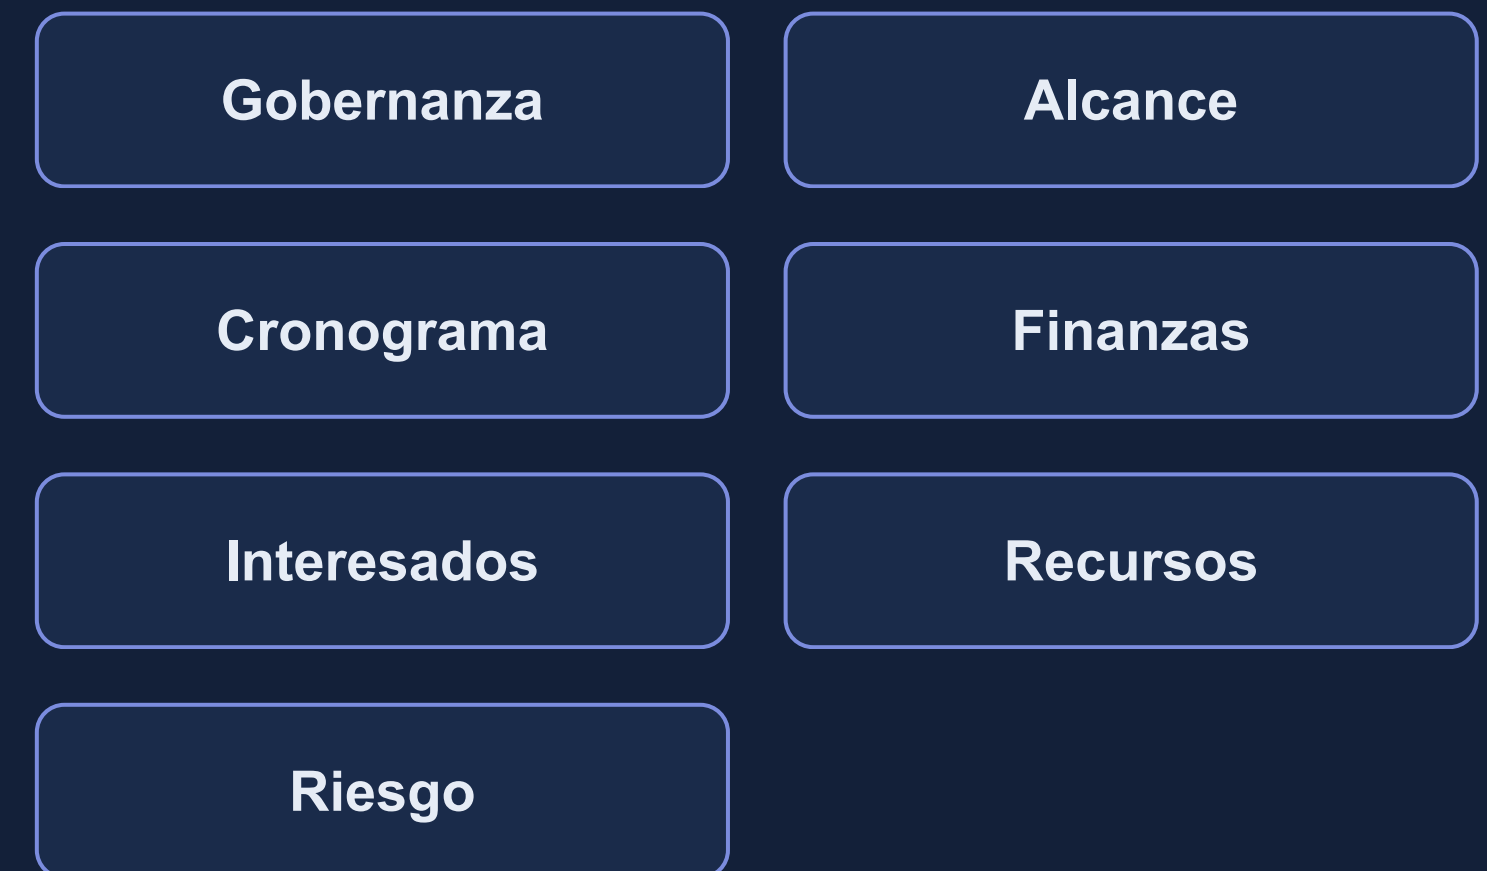



Healthcare.gov (EE. UU., 2013)



El proyecto

- Portal federal para contratar seguros de salud (Affordable Care Act).
- Desarrollado por el CMS con varios contratistas, entre ellos CGI Federal.
- Al abrir la inscripción (1 oct 2013) estuvo caído la mayor parte del primer mes.

1 oct 2013

Lanzamiento con fallas graves

≈ 208 M USD

Sobrecostos por cambios constantes de requisitos

91 → 175 M+ USD


Nuevo contrato (ene 2014) que superó los 175 M en jun 2014

GAO-14-694

Auditoría: planificación y supervisión ineficaces

Causa de fondo: gobernanza, requisitos y contratación; no solo tecnología.

Diagrama de Ishikawa: Healthcare.gov

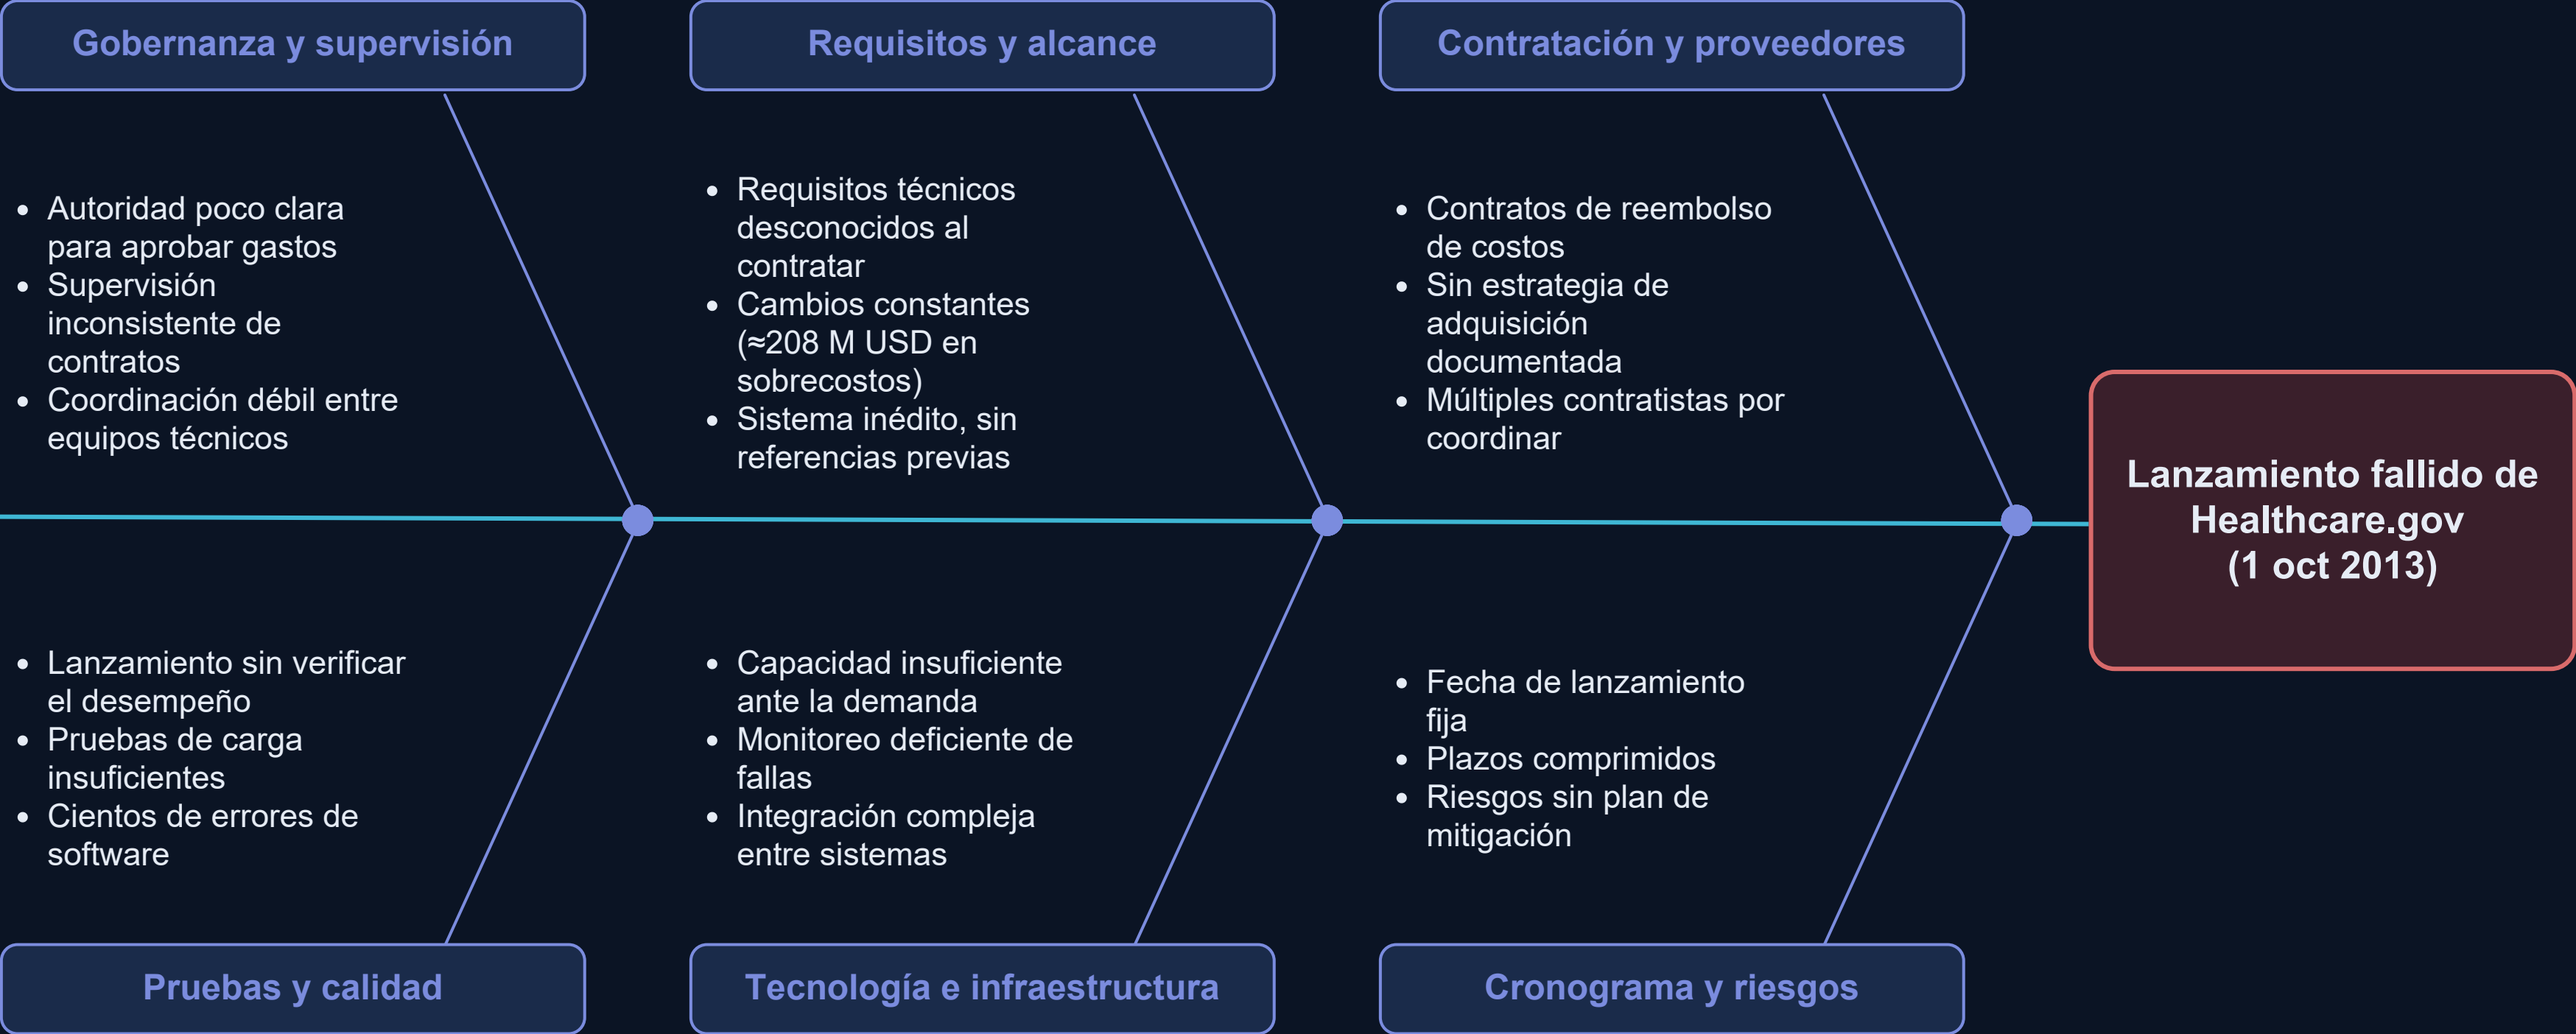



GOV.UK (Reino Unido, 2012) y comparación



GOV.UK

Portal único del gobierno británico, creado por el Servicio Digital del Gobierno (GDS) para reemplazar múltiples sitios públicos.



Gobernanza clara



Enfoque en el usuario



Entregas iterativas (alfa/beta)



Equipo multidisciplinario

Aspecto	Healthcare.gov	GOV.UK
Requisitos	Desconocidos y cambiantes	Descubiertos junto con los usuarios
Enfoque	Lanzamiento único con fecha fija	Versiones alfa y beta iterativas
Gobernanza	Autoridad difusa	Equipo central con autoridad
Foco	Cumplir el hito de lanzamiento	Valor para el usuario
Resultado	Sitio caído y sobrecostos	Portal adoptado y consolidado



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- 1 El éxito se mide por el valor entregado, no solo por alcance, tiempo y costo.
- 2 Solo 31 % de los proyectos fue exitoso (CHAOS 2020); se lee como tendencia.
- 3 Los fracasos nacen de la gestión y la gobernanza antes que de la tecnología.
- 4 Un enfoque iterativo y centrado en el usuario, como GOV.UK, reduce el riesgo.

Recomendaciones

- 1 Definir éxito y beneficios medibles desde el inicio.
- 2 Involucrar a usuarios y patrocinador de principio a fin.
- 3 Estabilizar requisitos críticos y controlar los cambios.
- 4 Entregar por incrementos y probar el desempeño antes de lanzar.
- 5 Revisar el valor periódicamente y replantear si ya no se justifica.



Referencias

- Atkinson, R. (1999). Project management: Cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it's time to accept other success criteria. *International Journal of Project Management*, 17(6), 337–342. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(98\)00069-6](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00069-6)
- Eveleens, J. L., & Verhoef, C. (2010). The rise and fall of the Chaos report figures. *IEEE Software*, 27(1), 30–36. <https://doi.org/10.1109/MS.2009.154>
- Flyvbjerg, B., & Budzier, A. (2011). Why your IT project may be riskier than you think. *Harvard Business Review*, 89(9), 23–25.
- Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Prentice-Hall.
- Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1987). Critical factors in successful project implementation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, EM-34(1), 22–27.
- Project Management Institute. (2025). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Eighth edition*.
- Standish Group. (2020). *CHAOS 2020: Beyond infinity*. The Standish Group International.
- U.S. Government Accountability Office. (2014a). *Healthcare.gov: Ineffective planning and oversight practices underscore the need for improved contract management* (GAO-14-694). <https://www.gao.gov/products/gao-14-694>
- U.S. Government Accountability Office. (2014b). *Healthcare.gov: Contract planning and oversight practices were ineffective given the challenges and risks* (GAO-14-824T). <https://www.gao.gov/products/gao-14-824t>
- [Agregar referencia oficial de GOV.UK / Government Digital Service]
